

	Departament d'Enginyeria		pàg. 1 de 3
	Creat: 31/10/24	Rv.: 12/02/25 10:33	E2416
INSTAL·LACIÓ D'AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC HP i FLE			
Fitxa d'obres 2			

INFORMACIÓ GENERAL DE LES OBRES

Edifici	Hospital de Palamós i Fleming		
Zona	Coberta		
Data d'inici	14/02/2025	Data prevista de finalització	14/02/2025

Tasques

- Recollida material sobrant de la instal·lació de plaques fotovoltaïques a les teulades de l'edifici hospital i Fleming

Afectació a la mobilitat horitzontal

H.Palamós

- El divendres 14 de febrer de les 16h a les 17h es procedirà a la recollida del material sobrant al moll de carrega de farmàcia, durant aquest període de temps aquest pas quedarà tallat . (Adjuntem informe)
- Presència d'operaris, el circuit d'entrada i sortida serà per l'escala d'emergència d'urgències fins la planta 5 i el passadís esquerra. (adjuntem plànol)


Fleming

- El divendres 14 de febrer de 16h a 17h es procedirà a la recollida del material sobrant davant del CAP, durant aquest període de temps l'entrada /sortida al CAP serà per rehabilitació i les dues places de les ambulàncies estaran ocupades per la grua. (Adjuntem informe)
- Presència operaris, el circuit d'entrada i sortida serà l'escala principal .

PLANIFICACIÓ

Data	Hora	Tasques	Responsable (buit -> contractista)
14/02/2025	16h-17h	Recollida material hospital.	
	17h-18h	Recollida material Fleming.	

PLÀNOLS DE LES ZONES D'INTERVENCIÓ

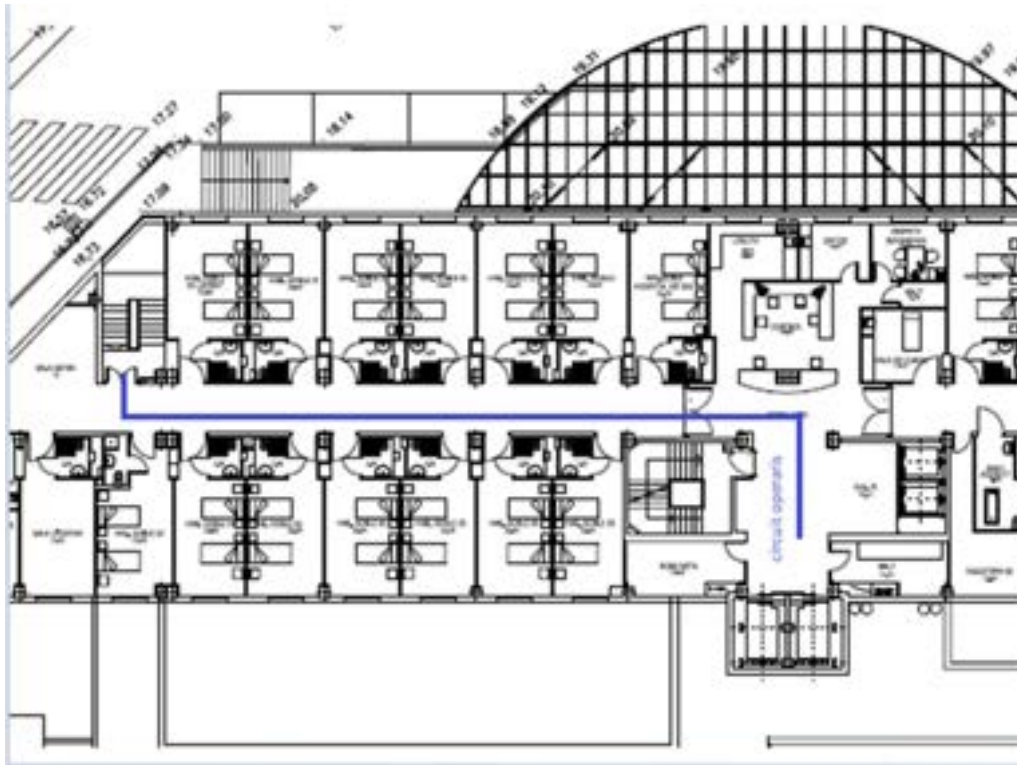

MESURES DE BIOSEGURETAT A APLICAR

- Circuit específic per a operari, materials .

COMUNICACIONS

Aquesta fitxa es comunica a la Direcció assistencial, la Comissió d'infecciosos, el Servei de prevenció, el Servei de neteja i al Servei de comunicació. La comunicació pot ser a tot el grup o a un membre representatiu d'acord a la intervenció.

SOL·LICITUD DESCÀRREGA DE MATERIAL SOBRANT D'UNA INSTAL·LCIÓ FOTOVOLTAICA

Hospital de Palamós: Dia **14/02/2025** a les **16:00** hores

Adreça: Carrer Hospital, 36



Ubicació de la descàrrega:



CAP de Palamós: Dia **14/02/2025** a les **17:00** hores

Adreça: Carrer Hospital, 17-19



